

Vitocal 100-S

Typ AWB 101.A12, AWB 101.A14, AWB 101.A16, AWB-E 101.A12, AWB-E 101.A14, AWB-E 101.A16, AWB-E-AC 101.A12, AWB-E-AC 101.A14, AWB-E-AC 101.A16, AWB-M 101.A04, AWB-M 101.A06, AWB-M 101.A08, AWB-M 101.A12, AWB-M 101.A14, AWB-M 101.A16, AWB-M-E 101.A04, AWB-M-E 101.A06, AWB-M-E 101.A08, AWB-M-E 101.A12, AWB-M-E 101.A14, AWB-M-E 101.A16, AWB-M-E-AC 101.A04, AWB-M-E-AC 101.A06, AWB-M-E-AC 101.A08, AWB-M-E-AC 101.A12, AWB-M-E-AC 101.A14, AWB-M-E-AC 101.A16

Herstell-Nr.: 7560594, 7560595, 7560596, 7560597, 7560598, 7560599, 7560600, 7560601, 7560602, 7571392, 7571393, 7572270, 7572271, 7572272, 7572273

Sicherheitshinweise



Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.

Bei Wärmepumpen: Arbeiten am Kältemittelkreislauf dürfen nur von Fachkräften, die dazu berechtigt sind, durchgeführt werden.


Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z. B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schließen und gegen ungewolltes Öffnen sichern.

Nach Montage Gasdichtheit prüfen.

Instandsetzungsarbeiten an Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion sind unzulässig. Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden. Montage der Bauteile mit neuen Dichtungen.

Verschleißteile finden

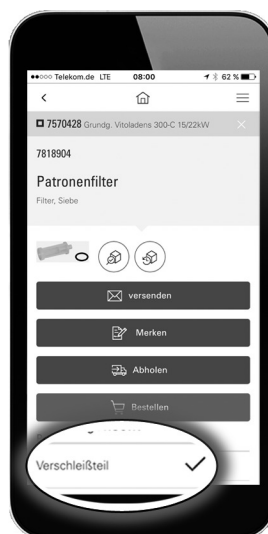

Die zur Wartung benötigten Verschleißteile können direkt über die Viessmann Ersatzteil App identifiziert und bestellt werden.



Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Durchzuführende Arbeiten

Arbeitsschritt	Erledigt
1. Wärmepumpe öffnen	☐
2. Kältekreis auf Dichtheit prüfen	☐
3. Ausdehnungsgefäß und Druck des Heizkreises prüfen	☐
4. Elektrische Anschlüsse der Inneneinheit auf festen Sitz prüfen	☐
5. Freien Lauf des Ventilators in der Außeneinheit prüfen	☐
6. Wärmetauscher (Verdampfer) der Außeneinheit reinigen	☐
7. Elektrische Anschlüsse der Außeneinheit auf festen Sitz prüfen	☐
8. Wärmepumpe schließen	☐
9. Netzspannung einschalten	☐
10. Wärmepumpe einschalten	☐
11. Wärmepumpe auf Geräusche prüfen	☐
12. Funktion der Anlage prüfen	☐
